

RELATÓRIO DE TRABALHO PRÁTICO FINAL

Projeto: TPF_AldaBenta_NorVita

Empresa: NorVita, S.A. — Implementação de CRM em Cloud

Orçamento Aprovado (BAC): 50.000 € | Prazo: 3 meses

FASE A — Governança e Configuração

1.1 Project Charter

Objetivo do Projeto

Substituir o sistema de gestão de clientes atual da NorVita, S.A. por uma plataforma CRM em cloud, integrada com o sistema de faturação existente, de modo a melhorar a eficiência operacional, centralizar a informação de clientes e reduzir os custos de manutenção do sistema legado.

Justificação

O sistema atual apresenta limitações funcionais significativas, não suporta o crescimento da empresa, tem elevados custos de manutenção e não se integra facilmente com outros sistemas. A nova plataforma CRM resolverá estes problemas, aumentando a produtividade das equipas comercial e de suporte.

Projeto vs. Operação

- Projeto: implementação, configuração, migração de dados, integração com faturação e formação (duração: 3 meses)
- Operação: utilização diária do CRM pelos colaboradores após o Go-Live (fora do âmbito deste projeto)

CrITÉrios de Sucesso Mensuráveis

- Migração de 100% dos dados de clientes sem perda de informação
- Go-Live concluído até ao final do mês 3 (outubro 2026)
- Integração com o sistema de faturação funcional e validada
- 100% dos utilizadores formados antes do Go-Live
- Orçamento respeitado: custo final ≤ 50.000 €

Âmbito

- Incluído: configuração da plataforma CRM, migração de dados, integração com faturação, testes, formação e documentação
- Excluído: substituição do sistema de faturação, suporte técnico pós Go-Live, desenvolvimento de funcionalidades adicionais

Orçamento Aprovado (BAC): 50.000 €

Membros						+ Membro	▼
NOME ↑	E-MAIL	PAPÉIS	GRUPOS	STATUS	TAXA ATUAL		
 Alda Marlene Benta		Project admin		ativo	0,00 EUR	✎	⌵
 Digital UÉvora		Member		ativo	0,00 EUR	✎	⌵
 Gestão Avançada e Controlo de Projetos de TI-GACPT		Project admin		ativo		✎	⌵

(1 - 3/3)

Por página: 20100

1.2 Matriz RACI

A tabela seguinte apresenta a Matriz RACI para as quatro atividades-chave do projeto.

Legenda: R = Responsável pela execução | A = Aprova/Autoriza | C = Consultado | I = Informado

Atividade	Gestor Projeto	Equipa Técnica	Sponsor	Fornecedor CRM
Levantamento de requisitos	R	A	C	I
Configuração da plataforma CRM	I	R	I	A
Migração de dados	A	R	I	C
Formação de utilizadores	R	A	C	I

Regra de Escalonamento:

Desvios superiores a 10% no custo ou no prazo são escalados ao Sponsor no prazo máximo de 24 horas após a sua deteção, com apresentação do impacto estimado e proposta de medida corretiva.

FASE B — Metodologia, Âmbito e Cronograma

2.1 Metodologia Selecionada: Waterfall

Opção escolhida: Waterfall (Cascata)

O projeto de implementação de CRM na NorVita apresenta requisitos bem definidos à partida, um orçamento fixo de 50.000 €, um prazo fechado de 3 meses e fases sequenciais com dependências claras. Estas características alinham-se com a metodologia Waterfall, onde cada fase só avança após validação da anterior.

Por que não Agile?

O Agile é ideal para projetos com requisitos voláteis e entregas incrementais (ex.: desenvolvimento de software). Neste caso, o âmbito está bem definido e a Administração da NorVita espera um plano estruturado com marcos claros e datas fixas.

Por que não Híbrida?

Uma metodologia híbrida seria adequada se houvesse uma componente de desenvolvimento de software complexo em paralelo com fases fixas. A integração com o sistema de faturação é pontual e não justifica a complexidade de gerir dois modelos em simultâneo.

2.2 WBS — Work Breakdown Structure

Todos abertos

+ Criar

Incluir projetos 1

Filtro 1

Tabela


ID ↑	ASSUNTO	TIPO	STATUS	ATRIBUIÇÃO	PRIORIDADE	*
4144	1. Planeamento	PHASE	New	-	Normal	
4148	1.1 Kick-off e definição de equipa	TASK	New	-	Normal	
4149	1.2 Levantamento de requisitos funcionais	TASK	New	-	Normal	
4150	1.3 Aprovação do plano de projeto	TASK	New	-	Normal	
4151	★ MILESTONE: Requisitos Aprovados	MILESTONE	New	-	Normal	
4145	2. Configuração e Desenvolvimento	PHASE	New	-	Normal	
4152	2.1 Setup e instalação da plataforma CRM	TASK	New	-	Normal	
4153	2.2 Configuração de perfis, permissões e fluxos	TASK	New	-	Normal	
4154	2.3 Desenvolvimento da integração com faturação	TASK	New	-	Normal	
4155	2.4 Testes de integração (faturação ↔ CRM)	TASK	New	-	Normal	
4146	3. Migração e Testes	PHASE	New	-	Normal	
4156	3.1 Extração e limpeza de dados do sistema antigo	TASK	New	-	Normal	
4157	3.2 Migração de dados para o novo CRM	TASK	New	-	Normal	
4158	3.3 Testes funcionais e de aceitação (UAT)	TASK	New	-	Normal	
4159	★ MILESTONE: Migração Validada	MILESTONE	New	-	Normal	
4147	4. Arranque	PHASE	New	-	Normal	
4160	4.1 Formação de utilizadores	TASK	New	-	Normal	
4161	4.2 Documentação e manuais de utilizador	TASK	New	-	Normal	
4162	★ MILESTONE: Go-Live	MILESTONE	New	-	Normal	

+ Criar novo pacote de trabalho


(1 - 19/19)

Nota: A WBS contém 19 itens — 12 tarefas distribuídas por 4 fases e 3 Milestones (★ Requisitos Aprovados, ★ Migração Validada, ★ Go-Live).

2.3 Gráfico de Gantt

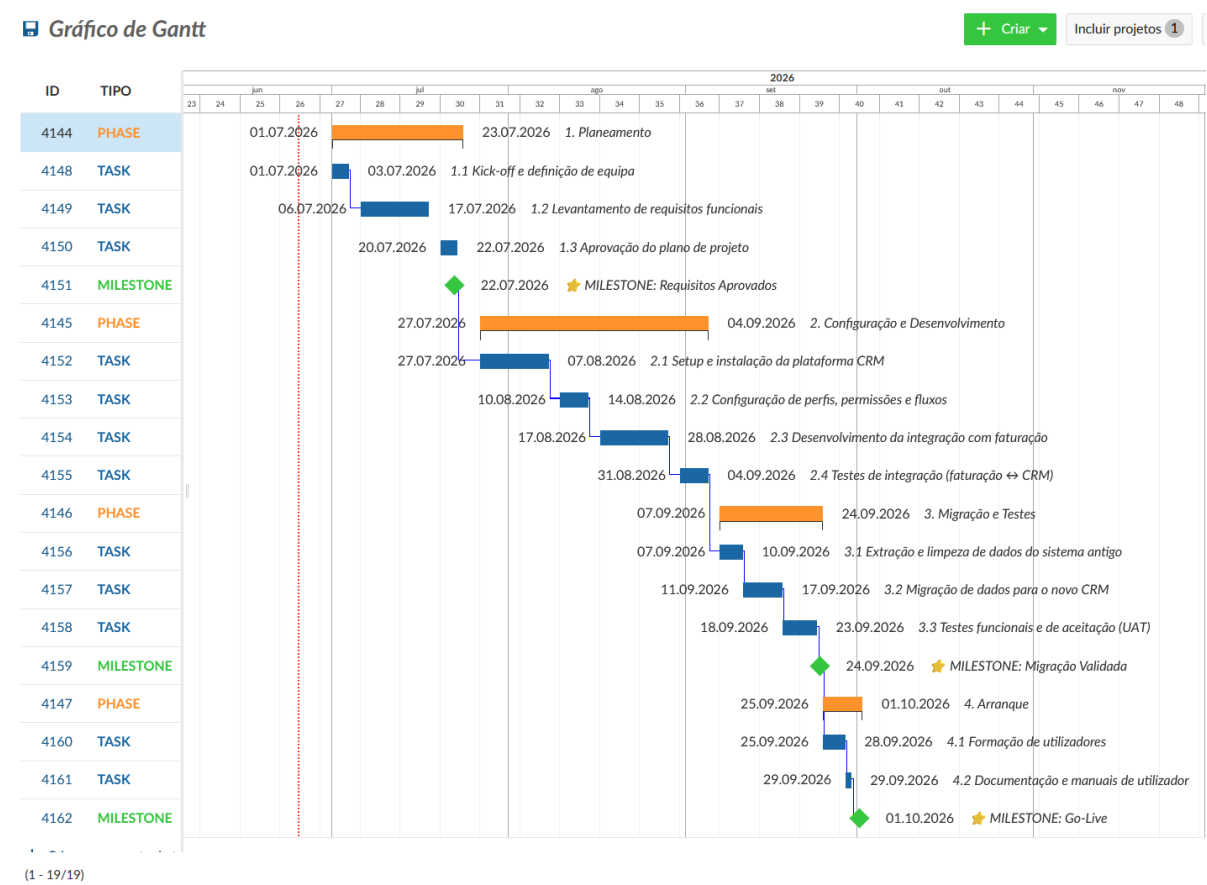

2.4 Board Kanban

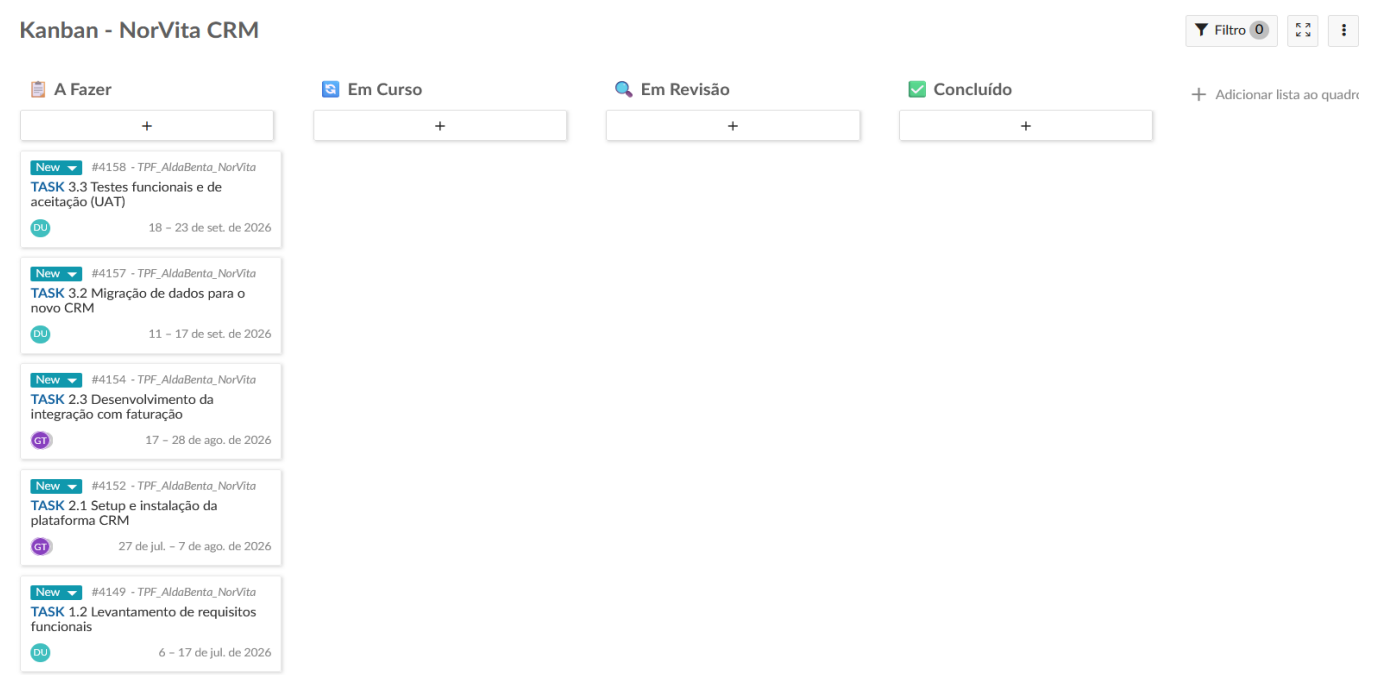

O board contém 4 colunas: A Fazer | Em Curso | Em Revisão | Concluído, com 5 Work Packages associados.

FASE C — Gestão de Riscos

3.1 Registo de Riscos

Foram identificados 5 riscos principais para o projeto, analisados segundo a matriz Probabilidade × Impacto.

#	Risco	Prob.	Impacto	Nível	Estratégia	Responsável
R1	Atraso na migração de dados	Alta	Alto	Crítico	Mitigar	Gestor de Projeto
R2	Incumprimento do RGPD	Média	Alto	Alto	Evitar	Jurídico / DPO
R3	Indisponibilidade do fornecedor CRM	Baixa	Alto	Médio	Transferir	Gestor de Projeto
R4	Sobrealocação da equipa técnica	Alta	Médio	Alto	Mitigar	Gestor de Projeto
R5	Falha de integração com faturação	Média	Alto	Alto	Mitigar	Equipa Técnica

3.2 Estratégias de Resposta Detalhadas

R1 — Mitigar: Atraso na migração de dados

Criar um plano de migração detalhado com testes antecipados em ambiente de homologação e backups completos antes de cada fase de migração.

R2 — Evitar: Incumprimento do RGPD

Envolver o DPO (Data Protection Officer) desde o início do projeto e garantir conformidade legal antes da migração de dados pessoais.

R3 — Transferir: Indisponibilidade do fornecedor CRM

Incluir cláusulas contratuais de disponibilidade garantida (SLA) e penalizações por incumprimento no contrato com o fornecedor.

R4 — Mitigar: Sobrealocação da equipa técnica

Monitorizar a carga de trabalho semanalmente e redistribuir tarefas entre recursos sempre que a alocação ultrapassar 160h/mês.

R5 — Mitigar: Falha de integração com faturação

Realizar testes de integração em ambiente de teste antes do Go-Live, com validação funcional completa pelo responsável técnico.

FASE D — Recursos e Orçamento

4.1 Atribuição de Recursos e Esforço

ID ↑	ASSUNTO	TIPO	STATUS	ATRIBUIÇÃO	PRIORIDADE	TEMPO ESTIMADO	
4144	1. Planeamento	PHASE	New	-	Normal	(40 hs)	
4148	1.1 Kick-off e definição de equipa	TASK	New	AB Alda Marlene Benta	Normal	8 hs	
4149	1.2 Levantamento de requisitos funcionais	TASK	New	DU Digital UÉvora	Normal	24 hs	
4150	1.3 Aprovação do plano de projeto	TASK	New	AB Alda Marlene Benta	Normal	8 hs	
4151	★ MILESTONE: Requisitos Aprovados	MILESTONE	New	-	Normal	-	
4145	2. Configuração e Desenvolvimento	PHASE	New	-	Normal	(156 hs)	
4152	2.1 Setup e instalação da plataforma CRM	TASK	New	GT Gestão Avançada e Controlo de P...	Normal	40 hs	
4153	2.2 Configuração de perfis, permissões e fluxos	TASK	New	GT Gestão Avançada e Controlo de P...	Normal	32 hs	
4154	2.3 Desenvolvimento da integração com faturação	TASK	New	GT Gestão Avançada e Controlo de P...	Normal	60 hs	
4155	2.4 Testes de integração (faturação ↔ CRM)	TASK	New	GT Gestão Avançada e Controlo de P...	Normal	24 hs	
4146	3. Migração e Testes	PHASE	New	-	Normal	(120 hs)	
4156	3.1 Extração e limpeza de dados do sistema antigo	TASK	New	DU Digital UÉvora	Normal	40 hs	
4157	3.2 Migração de dados para o novo CRM	TASK	New	DU Digital UÉvora	Normal	48 hs	
4158	3.3 Testes funcionais e de aceitação (UAT)	TASK	New	DU Digital UÉvora	Normal	32 hs	
4159	★ MILESTONE: Migração Validada	MILESTONE	New	-	Normal	-	
4147	4. Arranque	PHASE	New	-	Normal	(40 hs)	
4160	4.1 Formação de utilizadores	TASK	New	AB Alda Marlene Benta	Normal	24 hs	
4161	4.2 Documentação e manuais de utilizador	TASK	New	AB Alda Marlene Benta	Normal	16 hs	
4162	★ MILESTONE: Go-Live	MILESTONE	New	-	Normal	-	

(1 - 19/19)

4.2 Análise e Correção de Sobrealocação

Sobrealocação identificada: Técnico de Sistemas

O Técnico de Sistemas estava inicialmente alocado a 204 horas, ultrapassando o limite de 160h/mês em 44 horas (~27%).

- 2.1 Setup CRM: 40h
- 2.2 Configuração de perfis: 32h
- 2.3 Integração com faturação: 60h
- 2.4 Testes de integração: 24h
- 3.2 Migração de dados: 48h
- Total inicial: 204h ⚠

Correção aplicada:

A tarefa 3.2 Migração de dados (48h) foi redistribuída para o Consultor CRM, que dispunha de capacidade disponível. O Técnico de Sistemas ficou com 156h (dentro do limite) e o Consultor CRM passou de 96h para 144h — ambos dentro do limite de 160h/mês.

4.3 Orçamento do Projeto (BAC: 50.000 €)

Orçamentos

# ↓	ASSUNTO	PLANEJADO	GASTO	DISPONÍVEL
10	Orçamento NorVita CRM	50.000 EUR	0 EUR	50.000 EUR
		50.000 EUR	0 EUR	50.000 EUR

Gasto (taxa)

0% Progresso total

UNIDADES

Custos unitários planejados

UNIDADES	TIPO DE CUSTO	COMENTÁRIO	ORÇAMENTO
12000.00	Software	Licença CRM anual	12.000,00 EUR
8000.00	Equipamento de Informática	Infraestrutura cloud	8.000,00 EUR
12320.00	Consultores	Reserva de contingência	12.320,00 EUR
			32.320,00 EUR

TRABALHO

Custos planejados de trabalho

HORAS	USUÁRIO	COMENTÁRIO	ORÇAMENTO
56.00 horas	Alda Marlene Benta	50€/hora	2.800,00 EUR
156.00 horas	Gestão Avançada e Controlo de Projetos de TI-...	40€/hora	6.240,00 EUR
144.00 horas	Digital UÉvora	60€/hora	8.640,00 EUR
			17.680,00 EUR

Item / Perfil	Custo/hora	Horas	Total
Gestor de Projeto (AB)	50 €/h	32 h	1.600 €
Técnico de Sistemas (GT)	40 €/h	156 h	6.240 €
Consultor CRM (DU)	60 €/h	144 h	8.640 €
Formador (AB)	50 €/h	24 h	1200 €
Licença CRM (anual)	—	—	12.000 €
Infraestrutura cloud	—	—	8.000 €
Reserva de contingência	—	—	12.320 €
TOTAL (BAC)			50.000 €

4.4 Registro de Tempo (Planeado vs. Real)

ID	Assunto	Tipo	Status	Atribuição	Prioridade	Tempo Estimado	Tempo Gasto
4144	1. Planejamento	PHASE	New	-	Normal	(40 hs)	43 hs
4148	1.1 Kick-off e definição de equipa	TASK	New	AB Alda Marlene Benta	Normal	8 hs	8 hs
4149	1.2 Levantamento de requisitos funcionais	TASK	New	DU Digital UÉvora	Normal	24 hs	29 hs
4150	1.3 Aprovação do plano de projeto	TASK	New	AB Alda Marlene Benta	Normal	8 hs	6 hs
4151	★ MILESTONE: Requisitos Aprovados	MILESTONE	New	-	Normal	-	0 h
4145	2. Configuração e Desenvolvimento	PHASE	New	-	Normal	(156 hs)	110 hs
4152	2.1 Setup e instalação da plataforma CRM	TASK	New	GT Gestão Avançada e Controlo de P...	Normal	40 hs	45 hs
4153	2.2 Configuração de perfis, permissões e fluxos	TASK	New	GT Gestão Avançada e Controlo de P...	Normal	32 hs	0 h
4154	2.3 Desenvolvimento da integração com faturação	TASK	New	GT Gestão Avançada e Controlo de P...	Normal	60 hs	65 hs
4155	2.4 Testes de integração (faturação ↔ CRM)	TASK	New	GT Gestão Avançada e Controlo de P...	Normal	24 hs	0 h
4146	3. Migração e Testes	PHASE	New	-	Normal	(120 hs)	38 hs
4156	3.1 Extração e limpeza de dados do sistema antigo	TASK	New	DU Digital UÉvora	Normal	40 hs	38 hs
4157	3.2 Migração de dados para o novo CRM	TASK	New	DU Digital UÉvora	Normal	48 hs	0 h
4158	3.3 Testes funcionais e de aceitação (UAT)	TASK	New	DU Digital UÉvora	Normal	32 hs	0 h
4159	★ MILESTONE: Migração Validada	MILESTONE	New	-	Normal	-	0 h
4147	4. Arranque	PHASE	New	-	Normal	(40 hs)	0 h
4160	4.1 Formação de utilizadores	TASK	New	AB Alda Marlene Benta	Normal	24 hs	0 h
4161	4.2 Documentação e manuais de utilizador	TASK	New	AB Alda Marlene Benta	Normal	16 hs	0 h
4162	★ MILESTONE: Go-Live	MILESTONE	New	-	Normal	-	0 h

Tarefa	Horas Planeadas	Horas Reais	Desvio
1.1 Kick-off	8h	8h	0h
1.2 Levantamento de requisitos	24h	29h	+5h
1.3 Aprovação do plano	8h	6h	-2h
2.1 Setup CRM	40h	45h	+5h
2.3 Integração com faturação	60h	65h	+5h
3.1 Extração/limpeza dados	40h	38h	-2h
Total	180h	191h	+11h

O projeto apresenta um desvio total de +11 horas face ao planeado. As tarefas de levantamento de requisitos, Setup do CRM e integração com faturação registaram mais horas do que o previsto, o que é consistente com o CPI de 0,90 calculado na análise EVM. A tarefa de aprovação do plano e a extração de dados foram concluídas abaixo do estimado, compensando parcialmente o desvio.

Task #4148: 1.1 Kick-off e definição de equipa	8.00 horas	8.00 horas
Task #4149: 1.2 Levantamento de requisitos funcionais	29.00 horas	29.00 horas
Task #4150: 1.3 Aprovação do plano de projeto	6.00 horas	6.00 horas
Task #4152: 2.1 Setup e instalação da plataforma CRM	45.00 horas	45.00 horas
Task #4154: 2.3 Desenvolvimento da integração com faturação	65.00 horas	65.00 horas
Task #4156: 3.1 Extração e limpeza de dados do sistema antigo	38.00 horas	38.00 horas
	191.00 horas	191.00 horas

FASE E — Monitorização e Earned Value (EVM)

5.1 Dados de Referência — Semana 6

PV = 20.000 € | EV = 18.000 € | AC = 20.000 € | BAC = 50.000 €

5.2 Cálculo dos Indicadores EVM

Indicador	Fórmula	Cálculo	Resultado
PV — Planned Value	Valor do trabalho planeado	—	20.000 €
EV — Earned Value	Valor do trabalho realizado	—	18.000 €
AC — Actual Cost	Custo real incorrido	—	20.000 €
BAC — Budget at Completion	Orçamento total aprovado	—	50.000 €
SV — Schedule Variance	EV - PV	18.000 - 20.000	-2.000 €
CV — Cost Variance	EV - AC	18.000 - 20.000	-2.000 €
SPI — Schedule Performance Index	EV / PV	18.000 / 20.000	0,90
CPI — Cost Performance Index	EV / AC	18.000 / 20.000	0,90
EAC — Estimate at Completion	BAC / CPI	50.000 / 0,90	≈ 55.556 €

5.3 Interpretação e Medidas Corretivas

Estado do projeto na Semana 6:

Na semana 6, a análise pelo método Earned Value Management revela que o projeto se encontra simultaneamente atrasado e acima do orçamento.

Prazo (Schedule):

O SV de -2.000 € e o SPI de 0,90 indicam que apenas 90% do trabalho planeado foi concluído. Por cada euro de trabalho previsto, apenas 0,90 € de valor foi efetivamente gerado — o projeto está atrasado.

Custo (Cost):

O CV de -2.000 € e o CPI de 0,90 confirmam que o projeto está a gastar mais do que o valor que está a produzir. A previsão do custo final (EAC) aponta para 55.556 €, ultrapassando o orçamento aprovado (BAC) em 5.556 € (+11%).

Medidas Corretivas Propostas:

- Renegociar o âmbito com o Sponsor, eliminando funcionalidades não críticas para recuperar margem orçamental

- Reforçar os recursos humanos nas tarefas em atraso, nomeadamente na migração de dados
- Implementar reuniões de acompanhamento semanais para detetar desvios mais cedo
- Rever as estimativas das tarefas restantes com base no CPI atual (0,90) para obter uma previsão mais realista
- Aplicar a regra de escalonamento: desvio de 11% > 10% → escalar ao Sponsor imediatamente
